


**400 V Aufsteckantrieb**

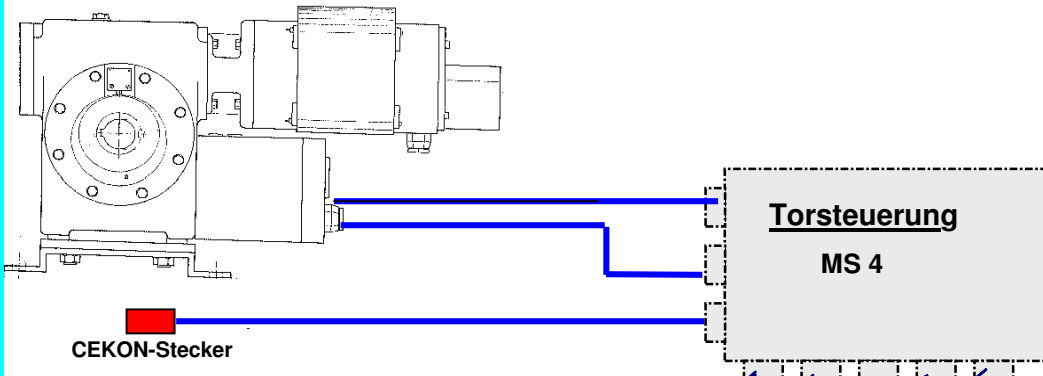

**Zuleitung 400V/16A bauseits**

**Außenbereich**

( Kabelverlegung erforderlich ! )

Schlüsselschalter AP / UP  2 x 0,8 <sup>□</sup>

Schaltsäule kpl. incl. Schlüsselschalter UP  2 x 0,8 <sup>□</sup>

Ampel - rot -  3 x 1,5 <sup>□</sup>

Ampelkombination - rot / grün - bei Ausführung Gegenverkehrsregelung  4 x 1,5 <sup>□</sup>

Induktionsschleife kpl. incl. Detektor  5 x 1,5 <sup>□</sup>

sonstige Impulsgeber  5 x 1,5 <sup>□</sup>

**Innenbereich I**

( vorverdrahtet v. Mischler Toranlagen )

Optische Kontaktleiste . ( Schließkantensicherung )

Lichtschranke 1 - oben außen - ( Griffsperr / Einzugssicherung )

Lichtschranke 2 - oben innen - ( Griffsperr / Einzugssicherung )

Lichtschranke 3 ( Durchfahrtsicherung )

**Innenbereich II**

( Kabelverlegung erforderlich ! )

2 x 0,8 <sup>□</sup> Deckenzugschalter

3 x 1,5 <sup>□</sup> Ampel - rot -

4 x 1,5 <sup>□</sup> Ampelkombination - rot / grün - bei Ausführung Gegenverkehrsregelung

5 x 1,5 <sup>□</sup> Induktionsschleife kpl. incl. Detektor

5 x 1,5 <sup>□</sup> sonstige Impulsgeber ( z.B. Schrankenanlage , etc. )

**Auftragsbezogene Daten :**

**Bauvorhaben :**

**unsere Auftr.-Nr.:**

Die angekreuzten Elemente sind im Lieferumfang enthalten. Diese Kabel sind bauseits zu verlegen.

Kabelverlegungsplan

**Tiefgaragen - Rollgitter 400 V**

Zeichnungsnummer :

**ZB - 701 - C**

Stand : Juli 2005
